



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW


MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Travanj 2025.

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	2
2	NAPREDAK RADOVA	3
2.1	Osnovne napomene	3
2.2	Sunčana elektrana	4
2.3	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat i izgradnja pomoćnog objekta	4
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	5

1 SHEMA GRADILIŠTA

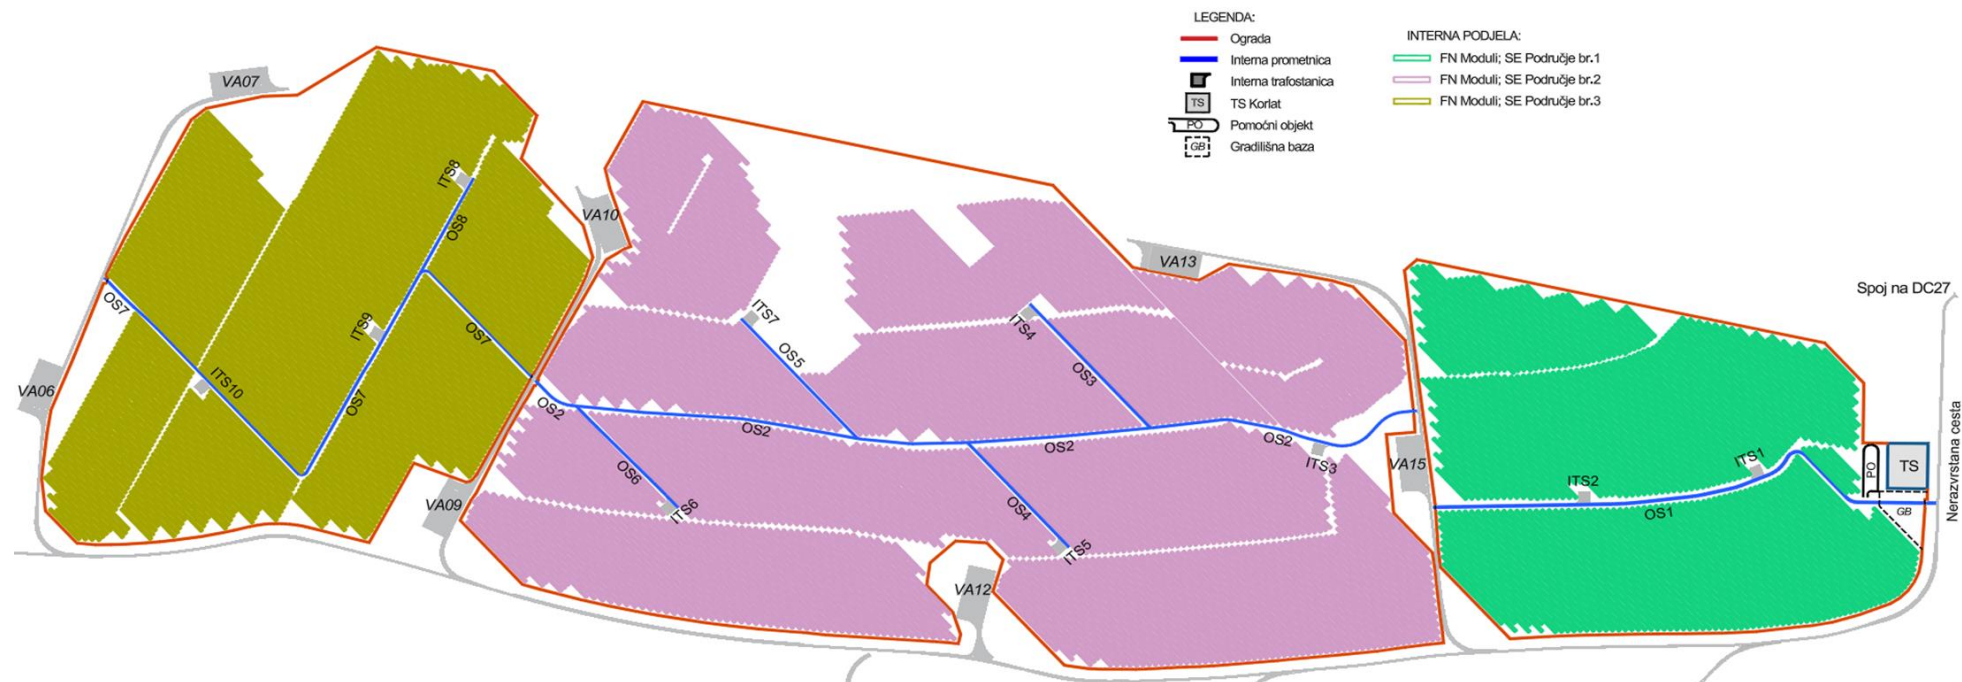

2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	<u>Energetski park Korlat (EPK)</u> je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. U tijeku je izmjena i dopuna glavnog projekta uslijed izmjene tehničkog rješenja SE Korlat (Etapu 6, faza 1), sukladno konačno odabranoj opremi i tehnologijama kojima se planira izvesti izgradnja SE. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je funkcionalan za građevinske radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu. Projektna dokumentacija - Projektant Fractal d.o.o. je 12. prosinca 2024. poslao izmijenjenu verziju glavnog projekta Ministarstvu na odobrenje. Rješenje je konačno zaprimljeno 2. svibnja. - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Izvođač je u travnju ostvario znatan napredak radova izgradnje pristupnih cesta elektrane. - U tijeku su radovi na ugradnji ograde sjevernog dijela gradilišta. - Započele su aktivnosti bušenja temelja za konstrukciju fotonaponskih modula. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom travnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.3 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat i izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Osnovne informacije	- Radovi u sklopu navedenih faza (2,3 i 4) su započeli krajem travnja. Do kraja mjeseca izvršeni su iskopi pomoćnog objekta te radovi pripreme za ulazak unutar trafostanicu; osiguranje područja pod naponom i pripremne aktivnosti za ugradnju armature.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

