



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW

MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Siječanj 2025.



FRACTAL d.o.o. ELEKTROTEHNIČKI I INFORMATIČKI INŽENJERING I KONZALTING


Kupreška 37, 21000 SPLIT | www.fractal.hr | fractal@fractal.hr

T: +385-(0)21-600771 | F: +385-(0)21-599894 | IBAN: HR0223600001101402645 | OIB: 05342281198

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	3
2	NAPREDAK RADOVA	4
2.1	Osnovne napomene	4
2.2	Sunčana elektrana	5
2.3	Izgradnja pomoćnog objekta	5
2.4	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat	6
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	7

1 SHEMA GRADILIŠTA

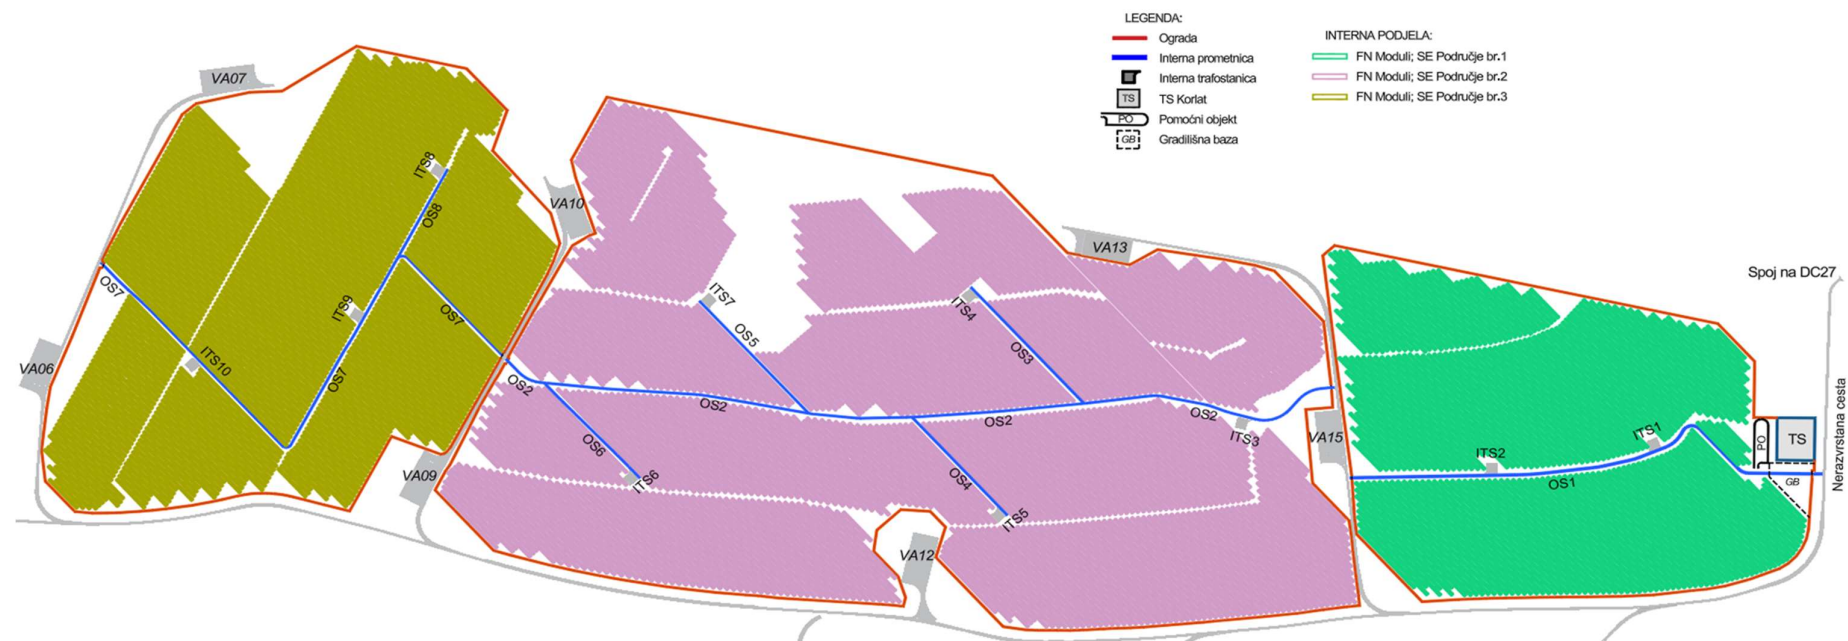

2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	<u>Energetski park Korlat (EPK)</u> je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. Izmjena i dopuna glavnog projekta je pravomoćna od 9. srpnja 2025. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca 2024. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci. Trenutno još nema znatnih odstupanja od ključnih događaja Projekta.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je funkcionalan za aktualne strukovne radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu i podiže dokaze kontrole kvalitete. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno predao svu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Završeni su radovi na niskonaponskoj kabelskoj mreži. - U tijeku finalni pregledi „tracker“ konstrukcije, te finalna spajanja invertera. - Izvođač se priprema za energizaciju elektrane, koja se očekuje sredinom veljače. - Izveden je asfaltni zastor na ulazu na gradilište. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom siječnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja. Izvođač ima aktivnu zaštitarsku službu na gradilištu i interni nadzor po pitanju zaštite radnika i okoliša. - Izvođač aktivno obavlja odvoze otpada s gradilišta, u skladu s mogućnostima.

2.3 Izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne radove predmetne faze. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno predao svu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom.

Predmet	Kratki opis
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Preostalo je ugraditi namještaj unutar objekta te završiti elektro radove u cijelosti. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom siječnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.4 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne faze radova na gradilištu – dio pod Vlasnikom te dio pod HOPS-om. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno predao svu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - HOPS je izdao pozitivno mišljenje za uvjetne primjedbe sa internog tehničkog pregleda. Izvođač je u međuvremenu otklonio i bezuvjetni set primjedbi. Kontrola kvalitete - Radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom siječnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

