



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW


MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Svibanj 2025.

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	2
2	NAPREDAK RADOVA	3
2.1	Osnovne napomene	3
2.2	Sunčana elektrana	4
2.3	Izgradnja pomoćnog objekta	4
2.4	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat	5
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	5

1 SHEMA GRADILIŠTA

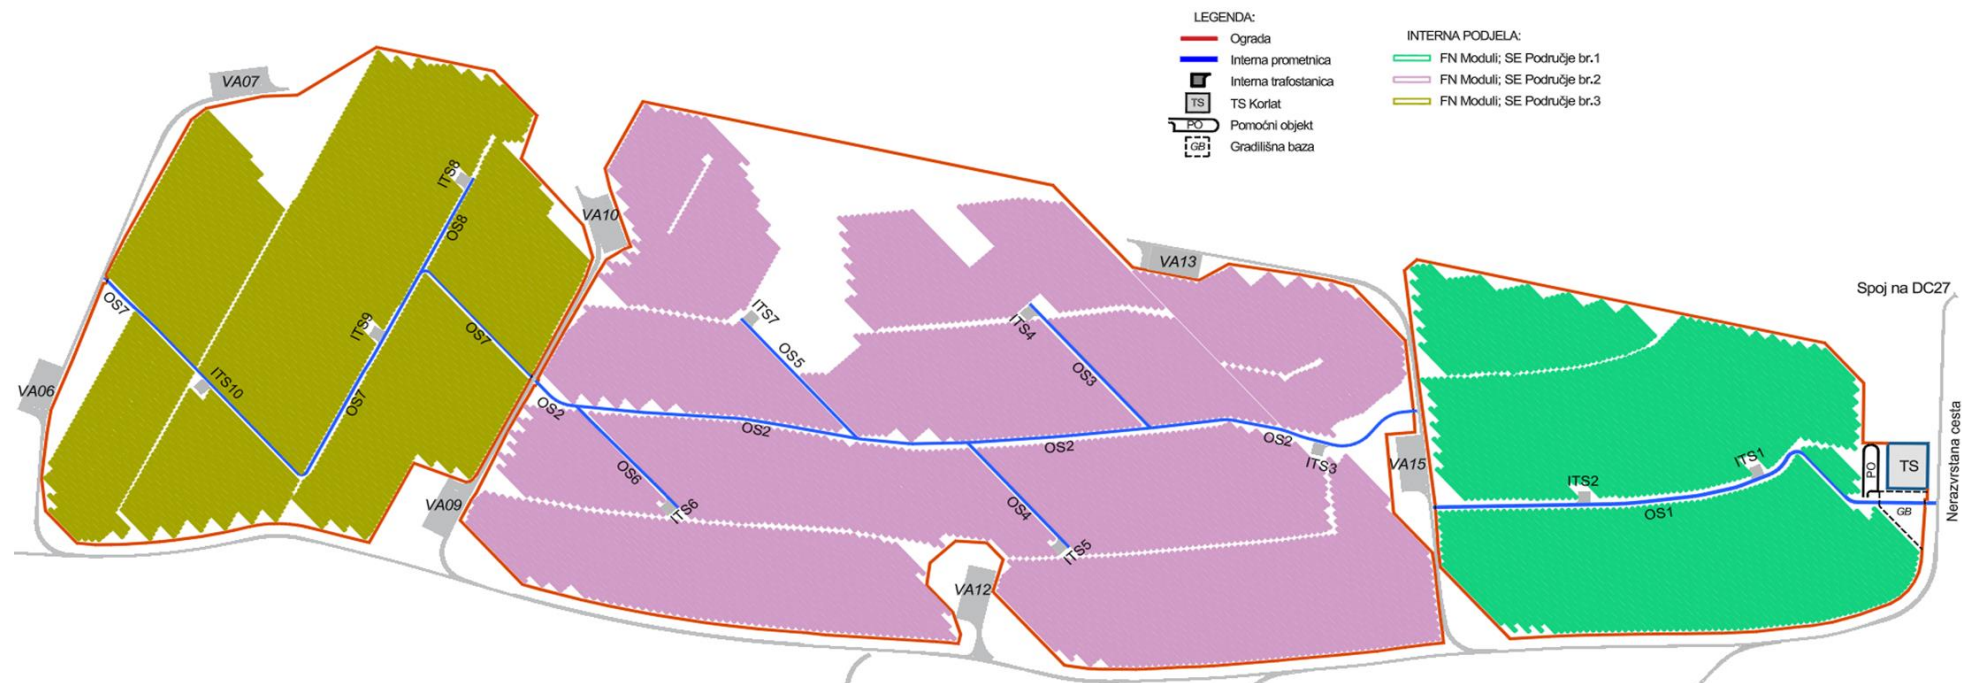

2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	Energetski park Korlat (EPK) je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. U tijeku je izmjena i dopuna glavnog projekta uslijed izmjene tehničkog rješenja SE Korlat (Etapu 6, faza 1), sukladno konačno odabranoj opremi i tehnologijama kojima se planira izvesti izgradnja SE. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je funkcionalan za građevinske radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu. Projektna dokumentacija - Projektant Fractal d.o.o. je 12. prosinca 2024. poslao izmijenjenu verziju glavnog projekta Ministarstvu na odobrenje. Rješenje je konačno zaprimljeno 2. svibnja. - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Izvođač se u svibnju primarno fokusirao na radove bušenja i montaže temelja konstrukcije panela. Do kraja mjeseca otprilike 1/5 ukupnih Projektom definiranih pozicija je izbušeno, i nešto više od polovice toga montirano. - Izrada pristupnih cesta unutar gradilišta je završena. - Radovi probijanja srednjenaponske kableske trase je započela u svibnju. Niskonaponska mreža rovova je također krenula s izradom nedugo nakon. - Radovi na ogradi oboda elektrane je u završnoj fazi. - U tijeku su iskopi za pozicije internih trafostanica. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.3 Izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutnu fazu radova na gradilištu. Projektna dokumentacija - Izvođač je dostavio kompletnu projektnu dokumentaciju za predmetne radove ove faze.

Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Radovi na pomoćnom objektu su započeli početkom mjeseca. Izvođač je u svibnju izvodio armirano-betonske radove, te popratne elektro i strojarske radove instalacija. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvođe u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.4 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne faze radova na gradilištu – dio pod EPK te dio pod HOPS-om.. Projektna dokumentacija - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Nakon osiguranja lokacije odgovarajućim mjerama oko energiziranih dijelova, Izvođač je krenuo s radovima unutar postrojenja. Radove izvodi podizvođač HELB. - U svibnju su se primarno izvodili armiranobetonski radovi na novom pogonskom objektu, te priprema za betonske radove na poziciji novog transformatora. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvođe u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

