



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW


MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Srpanj 2025.

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	2
2	NAPREDAK RADOVA	3
2.1	Osnovne napomene	3
2.2	Sunčana elektrana	4
2.3	Izgradnja pomoćnog objekta	4
2.4	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat	5
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	6

1 SHEMA GRADILIŠTA

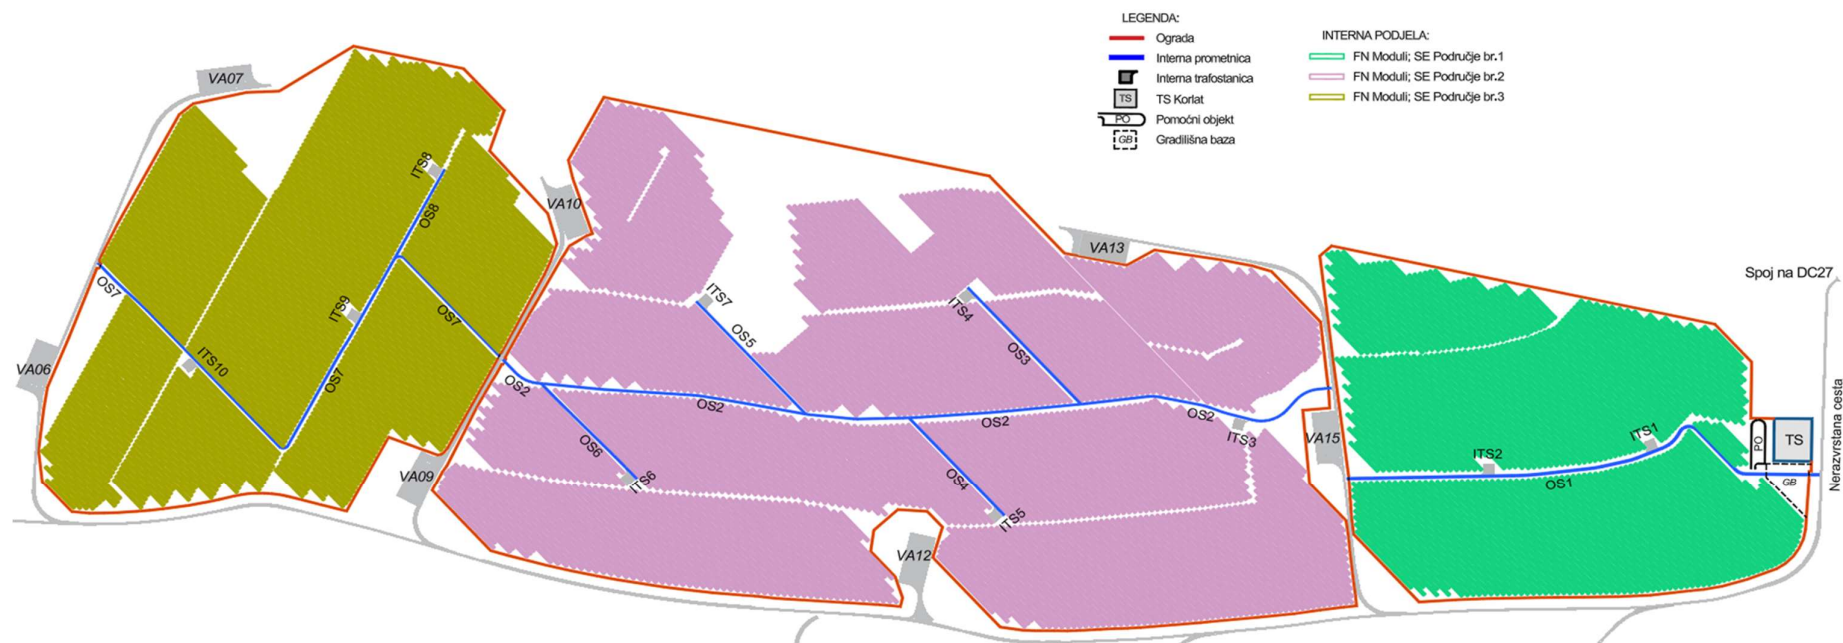

2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	<u>Energetski park Korlat (EPK)</u> je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. U tijeku je izmjena i dopuna glavnog projekta uslijed izmjene tehničkog rješenja SE Korlat (Etapu 6, faza 1), sukladno konačno odabranoj opremi i tehnologijama kojima se planira izvesti izgradnja SE. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci. Trenutno još nema znatnih odstupanja od vremenskog plana Projekta.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je funkcionalan za aktualne građevinske i elektrotehničke radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu i podiže dokaze kontrole kvalitete. Projektna dokumentacija - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Izvođač je u srpnju ostvario znatan napredak u pogledu montaže gornjih dijelova konstrukcije. U paraleli se izvodi ugradnja mikropilota na preostalom dijelu gradilišta. - Započeli su radovi polaganja srednjenaponske kableske mreže. Početak radova na polaganju niskonaponskog dijela se očekuje u kolovožu. - Nakon prethodno izvedenih zemljanih radova iskopa pozicija, Izvođač je u srpnju započeo s betonskim radovima na podzemnim elementima internih trafostanica te UPS objekata. - Ograda oko elektrane je u potpunosti ugrađena za trenutnu fazu radova. Pri završetku kompletnih građevinskih radova Izvođač će ugraditi ostatak. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima. Uvedeni su dodatni sastanci između Izvođača i tijela Nadzora na temu provedbe kontrole kvalitete radova uslijed povećanja obujma posla.
Ostale informacije	- Tijekom srpnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja. Izvođač ima aktivnu zaštitarsku službu na gradilištu. - Izvedena je protupožarna vježba sa radnicima Izvođača i njegovim podizvođačima za potrebe dizanja svijesti za vrijeme požarne sezone.

2.3 Izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne faze radova objekta. Projektna dokumentacija - Izvođač je dostavio kompletnu projektnu dokumentaciju za predmetne radove ove faze.

Predmet	Kratki opis
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Izvođač je tijekom srpnja betonirao zidove gornje etaže te krovnu ploču, čime se stiglo pred sam kraj betonskih radova na objektu. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvođe u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom srpnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.4 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne faze radova na gradilištu – dio pod Vlasnikom te dio pod HOPS-om. Projektna dokumentacija - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Tijekom srpnja nije bilo značajnih aktivnosti u postrojenju. Kontrola kvalitete - /
Ostale informacije	- Tijekom srpnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

