



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW


MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Rujan 2025.

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	2
2	NAPREDAK RADOVA	3
2.1	Osnovne napomene	3
2.2	Sunčana elektrana	4
2.3	Izgradnja pomoćnog objekta	4
2.4	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat	5
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	6

1 SHEMA GRADILIŠTA

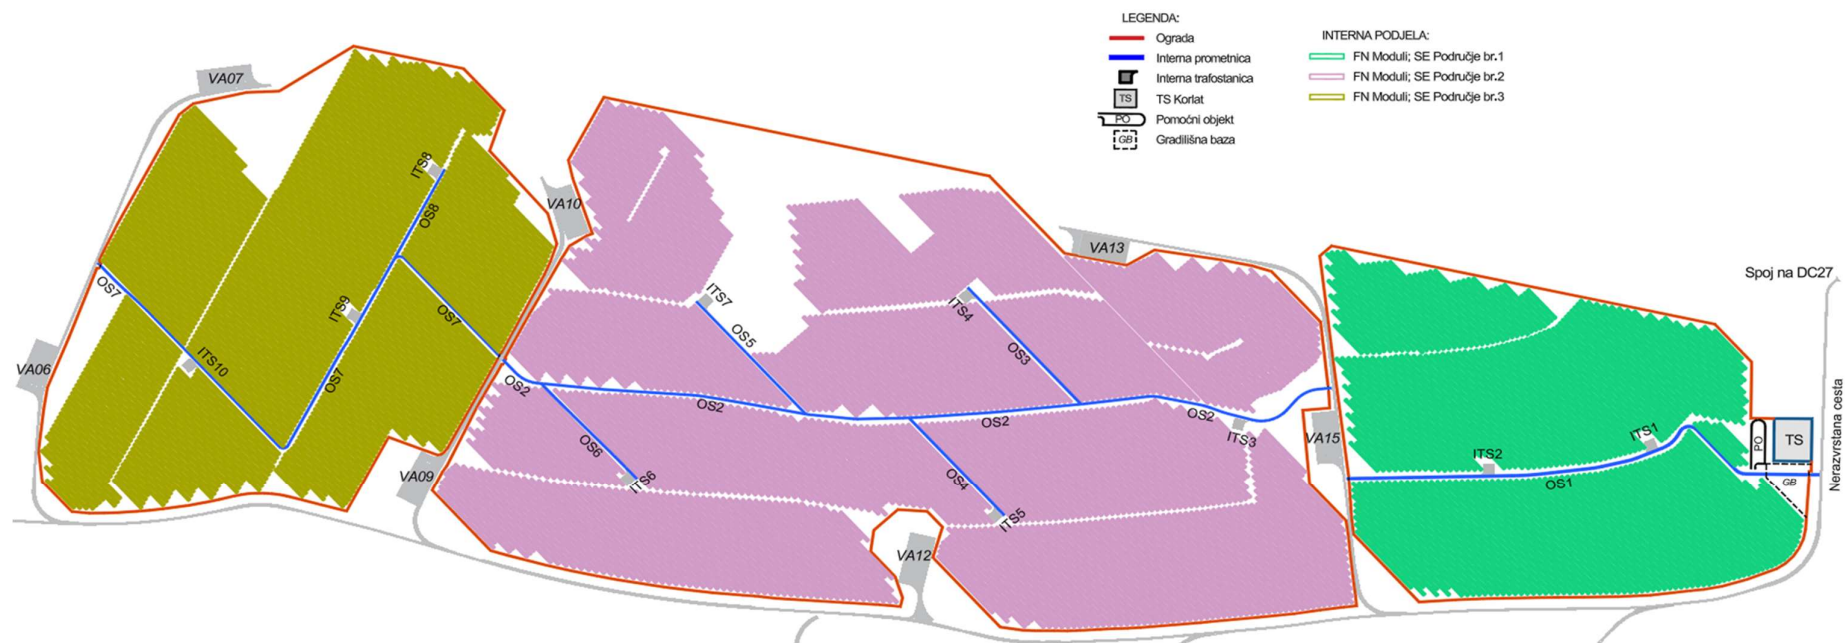

2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	<u>Energetski park Korlat (EPK)</u> je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. Izmjena i dopuna glavnog projekta je pravomoćna od 9. srpnja 2025. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci. Trenutno još nema znatnih odstupanja od ključnih događaja Projekta.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je funkcionalan za aktualne strukovne radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu i podiže dokaze kontrole kvalitete. Projektna dokumentacija - Izvođač je predao svu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom. Ista je odobrena od strane Nadzora.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - U tijeku su radovi polaganja niskonaponskih kabela na svim područjima gradilišta. Srednjenaponska kabelska mreža je u cijelosti položena. U tijeku je spajanje internih trafostanica. - Sustav rezervnog napajanja se očekuje na gradilištu tijekom listopada. - Izvođač je u rujnu nastavio s radovima montaže konstrukcije za FN module te montažu samih modula. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom rujna nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja. Izvođač ima aktivnu zaštitarsku službu na gradilištu i interni nadzor po pitanju zaptite radnika i okoliša. - Tijekom rujna održano je nekoliko nasumičnih internih inspekcija s ciljem utvrđivanja odstupanja od zahtjeva te manjkavosti provedbe poslova zaštite na radu te zaštite okoliša.

2.3 Izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne radove. Otvoren je novi poddnevnik za termotehničke radove. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno dostavio kompletnu projektnu dokumentaciju za predmetne radove ove faze.

Predmet	Kratki opis
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Tijekom rujna započeli su zanatski radovi unutar objekta – gips-kartonski radovi, vodoinstalaterski radovi, te termotehničke instalacije. - Stolarski elementi se očekuju na gradilištu početkom listopada. Završetak radova se očekuje do kraja kalendarske godine. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	Tijekom rujna nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.4 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - eDnevnik je aktivan za trenutne faze radova na gradilištu – dio pod Vlasnikom te dio pod HOPS-om. Projektna dokumentacija - Izvođač aktivno dostavlja svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Tijekom rujna Izvođač je odradio glavninu cjelokupnih građevinskih radova unutar postrojenja, te dopremao elektro opremu na lokaciju. - Kada transformatora je dovršena – hidroizolacijski premaz i montaža tračnica za prihvrat energetskog transformatora. - Kontejnerske jedinice pogonskog objekta su montirane. - Započelo je spajanje elektro opreme unutar objekta. Također, ugrađen je dio čelične konstrukcije unutar i oko transformatorske kade. Kontrola kvalitete - Radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	Tijekom rujna nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

